



Installateur :

**DEMANDE D'INSTALLATION  
TELERESEAU**

No:.....

(à nous adresser en 2 exemplaires)

Nom, prénom du propriétaire :

Circulation

Adresse :

Arrivée

Adresse exacte de l'installation :

Retour

Rue :

N°:

Achèvement

Contrôle

L'installateur soussigné, agissant au nom et pour le compte du propriétaire ci-dessus, demande le branchement du réseau de l'installation TV désignée ci-après.

L'installateur déclare avoir reçu en bonne et due forme les autorisations nécessaires de la part du propriétaire de l'immeuble.

Les installations de la présente demande seront faites conformément aux prescriptions et aux directives de TSEIC.

**DESCRIPTION DE L'INSTALLATION** (schéma au dos)

Nombre d'appartements :.....

Nombre de prises :.....

Nombre de colonnes :..... Modèle :.....

Installation mise en service par :.....

Téléviseurs locataires réglés par :.....

- Installation nouvelle
- Modification sur antenne existante
- Immeuble avec antenne extérieure
- Alimentation par sous-sol
- Alimentation par galetas
- L'antenne extérieure restera
- L'antenne extérieure sera démontée
- .....
- .....

Remarques de l'installateur :

Timbre et signature du  
Concessionnaire :

Date :

Signature :

**Autorisation d'installer**

Remarques de TSEIC :


Parcelle N° : .....

Ampli N° : .....

Date :

Visa :

# SCHÉMA DE L'INSTALLATION

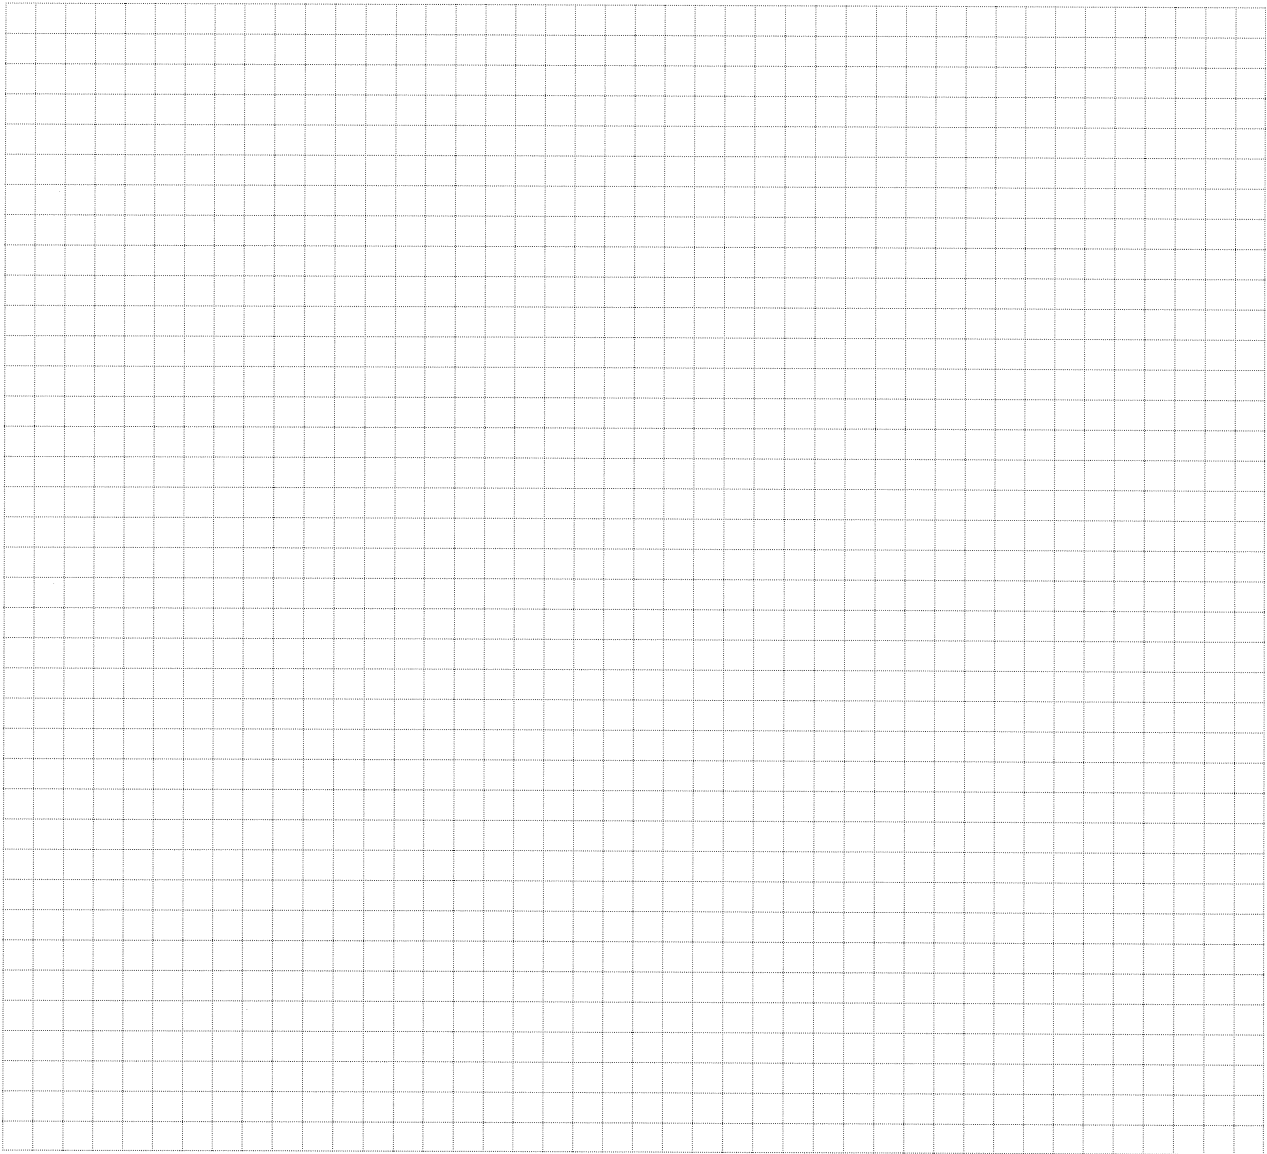


**Remarques :** Le type, marque et valeur des différents éléments constituant l'installation intérieure doivent impérativement être mentionnés.

**Prescriptions :** *Câbles :* Faible perte (18 db max. aux 100m à 860MHz)  
Double écran, 75 Ohms

- Prises :*
- 1) Découplage entre les sorties TV/R : min. 22 dB
  - 2) Découplage entre les 2 prises : min. 40 dB
  - 3) Multimedia série DD (Wisi)

## Symboles :

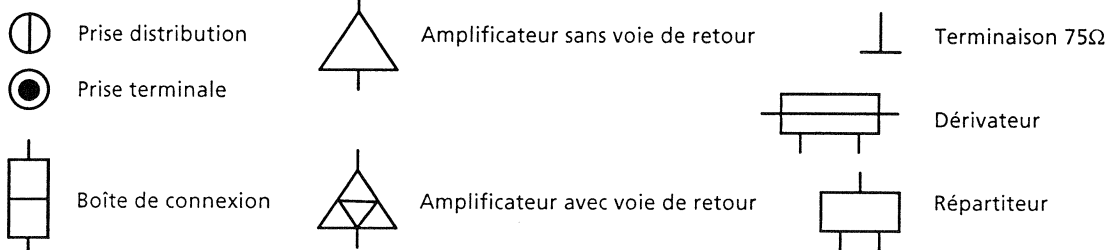



## RAPPORT DE MESURES (dB $\mu$ V)

Mesures faites par :	Date des mesures :
----------------------	--------------------

No prises	PP-PS-BC-N° sortie	S6	S15	22	32	68
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Installation conforme, mise en service le :	Signature :
---	-------------

**Observations :**

.....

.....

.....

.....

.....
